

关于“蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）”在预算控价评审中有关问题的回复

什邡市恒基建设投资发展有限公司：

我公司现对“蓉北高铁物流园项目（配套商业附属工程-站前广场）”在预算评审中所提问题逐一回复如下：

一、道路工程：两层油面之间不设置粘层么？具体做法？

回复：要设粘接层,设沥青粘接油一道，粘接油按 0.8Kg/平米。乳化沥青稀浆封层 1.05Kg/平米。

二、给排水：检查井无做法，无大小；雨水口无做法，无大小；沟槽开挖无尺寸？

回复：塑料检查井底部做 30 公分垫层；检查井具体做法要求详设计说明第四.5 条；室外雨水口做法详国标 05S518P6 砖砌平算式单算雨水口；沟槽开挖详剖面图。

三、绿化工程：种植土回填厚度不详？

回复：草坪种植土回填按 400 厚计算，树池及花池均按 600mm 厚，就地取土。

四、路灯工程：低杆路灯 高 4m 灯杆的大小、材质、厚度不详，样式？报送有手孔井，设计上无。

回复：1.经与景观建筑商定，停车场-低杆路灯与广场景观柱灯样式统一，均按景观柱灯定制，高 5m。镀锌钢板厚度 2.0mm，亚克力板厚 3.0mm

景观灯柱定制或选型参考

说明:

- 1、景观灯柱规格: 高5米, 灯柱截面400mmx400mm;
- 2、光源: 采用LED冷光源、灯臂;
- 3、材质: 灯体: 镀锌钢板, 灯罩: 亚克力板
- 4、景观灯柱具体样式由厂家定制, 并根据灯柱样式由厂家自行设计安装基础, 并保证其安全性。

2.手孔井按 10 个计, 规格 1200X900X1100, 做法参见 08D800-7 第 60,61 页。

五、总平停车场地面的做法? 路沿石布置的位置及颜色做法?

回复: 1.停车场车行道做法:

SBS 改性沥青混合料 AC-13 上面层厚 40mm

沥青粘接油一道 (0.8Kg/平米)


改性沥青混凝土 AC-16 下面层厚 50mm

改性乳化沥青稀浆封层 (1.05Kg/平米)

5.5%水泥稳定级配碎石基层厚 200mm

级配碎石基层厚 300mm

素土夯实

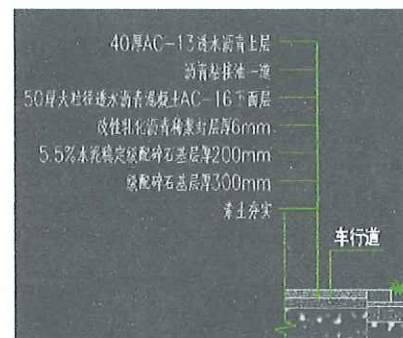

2.停车位做法:


60 厚嵌草水泥砖

30 厚粗砂垫层

100 厚 C25 混凝土, 光面


级配碎石基层厚 300mm

素土夯实

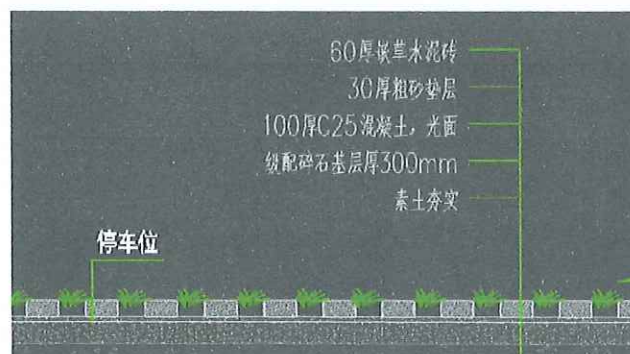

六、中国雪茄之乡基座：基础无断面，广告字无设计。

回复：1.基础参照下图

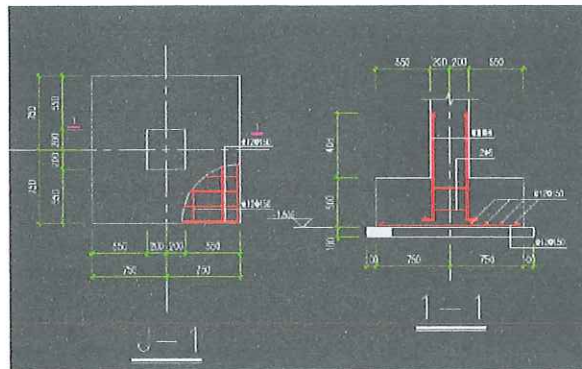

2.广告字为沟边字，采用 1.0mm 厚不锈钢板制作字壳，
3 厚亚克力板盖面，字厚 80mm，内置 LED 光源，字体大小
800x900mm。

七、树池、花池内土方回填厚度未明确，请明确。

回复：均按 600mm 厚，就地取土。

八、请明确 360° 无死角球型带云台的红外彩色摄像机
参数。

回复：本次仅预留穿线管，设备在下期实施。

九、标志杆平面图高为 3.5m，大样为 2.0-2.5m，请明确。

回复：标志杆为 3500mm 高，JT-2 大样写的
2000---2500mm 有误。

十、路沿石有两种材质（花岗石和预制混凝土），请明
确具体材质。

回复：统一为花岗石。

十一、设计标高与现有实际场地的高差是多少？

回复：按自然地坪低于设计标高平均 1.2m 考虑。

十二、铺装图中的“麻面花岗石”麻面是指烧面还是荔

枝面？

回复：地面铺装中的花岗石麻面指烧面。

十三、检查井、雨水井井周回填加强的具体做法？

回复：检查井、雨水井井周外围 1m 范围内采用 5.5% 水泥稳定级配碎石回填加固，回填深度随井的高度。

成都美厦建筑设计有限公司

2023 年 2 月 7 日

